PROJECT KICKOFF

Power BI - Araujo

Transformar dados em clareza, impulso e melhores decisões.

Construir uma visão compartilhada de desempenho que ajuda o time a se mover mais rápido e criar impacto real nos negócios.



Visão

Visibilidade clara dos números que mais importam.

Alinhamento

Uma única fonte de verdade para todo o time.

Impacto


Melhores decisões, execução mais rápida, resultados mais fortes.

Projeto

A Araujo Embalagens movimenta diariamente um grande volume de pedidos, clientes e produtos, e acompanhar esses números em relatórios e planilhas separadas toma tempo e abre espaço para divergências.

Este projeto propõe a criação de um painel de vendas em Power BI, conectado diretamente à base do sistema da empresa e atualizado de forma automática. A diretoria terá uma visão clara do faturamento, da evolução mensal e dos principais clientes e produtos. Os supervisores de vendas poderão acompanhar o desempenho de suas equipes e identificar oportunidades, como clientes que deixaram de comprar.

O desenvolvimento seguirá a metodologia Scrum, com entregas curtas e validações frequentes. A cada ciclo, a Araujo verá um resultado funcional, poderá conferir os números e ajustar as prioridades. Assim, o painel evolui junto com as necessidades do negócio e entrega valor desde as primeiras semanas.

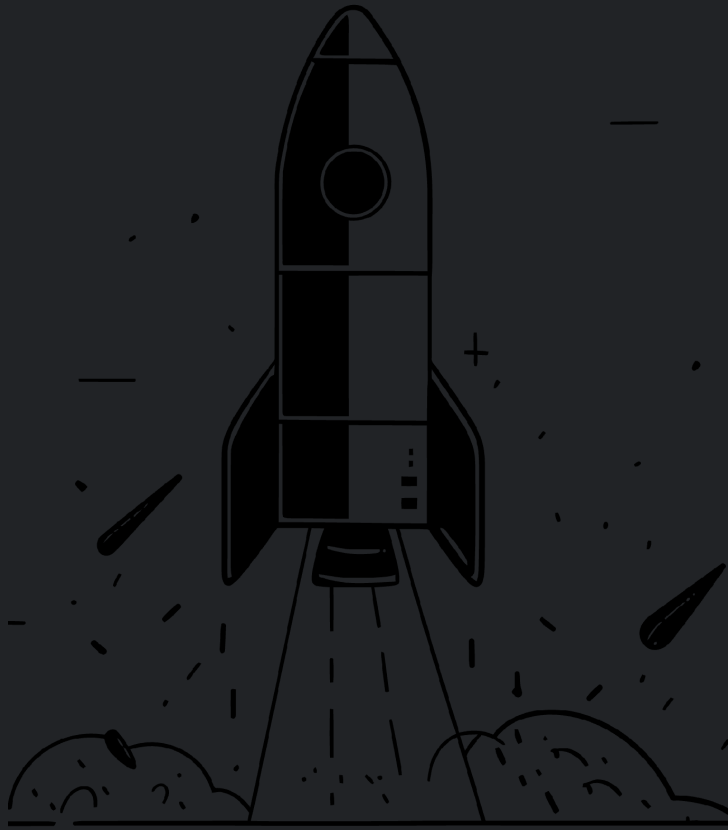

1. Product Goal

Entregar à diretoria e aos supervisores de vendas da Araujo Embalagens um painel de Business Intelligence confiável e com atualização automática, que substitua o acompanhamento manual de vendas por planilhas.

Fora do escopo (nesta fase): produção, estoque e financeiro. Ficam para uma fase 2, depois de validarmos a base de vendas.



2. Backlog do Produto

Prioridade: **A = essencial (MVP), M = importante, B = desejável.**

Função	Quem	Descrição
Product Owner	Representante da Araujo	Dono do Product Backlog, decide prioridades e aceita os incrementos
Scrum Master	Pedro Nicastro	Facilita os eventos e remove impedimentos
Developers	Pedro Nicastro	Modelagem e desenvolvimento ativo do projeto
StakeHolders	Representante da Araujo	Entregam Feedbacks do projeto para continuo aprimoramento

3. Product Backlog

Ordenado por valor e dependência. Cada item é um PBI (Product Backlog Item). Os Épicos agrupam PBIs relacionados.

ID	Épico	PBI (User Story)	Critérios de aceite
PBI-01	Fundação de dados	Como analista, quero conectar o Power BI à base do sistema.	Tabelas de pedidos, itens, clientes, produtos e vendedores importadas
PBI-02	Fundação de dados	Como analista, quero tratar e padronizar os dados.	Sem duplicidades; tipos corretos; inconsistências documentadas
PBI-03	Fundação de dados	Como analista, quero um modelo em estrela com tabela Calendário.	Relacionamentos validados; filtros de data funcionando
PBI-04	Visão da diretoria	Como diretor, quero ver faturamento total e evolução mensal.	Valor confere com o relatório de referência
PBI-05	Visão da diretoria	Como diretor, quero comparar com o mesmo período do ano anterior.	Variação em % e R$ exibida
PBI-06	Visão da diretoria	Como diretor, quero ver os maiores clientes e produtos.	Top 10 com % do total
PBI-08	Visão dos supervisores	Como supervisor, quero ver vendas por vendedor e equipe.	Ranking com valor, pedidos e ticket médio
PBI-12	Entrega	Como usuário, quero acessar o painel na web e no celular, sempre atualizado.	Publicado no Power BI Service com refresh agendado
PBI-11	**Visão dos supervisores**	**Como supervisor, quero ver apenas os dados da minha equipe.**	**RLS testada por supervisor**
PBI-10	**Visão dos supervisores**	**Como supervisor, quero identificar clientes inativos.**	**Lista com parâmetro de dias sem compra**
PBI-07	**Visão da diretoria**	**Como diretor, quero ver a margem bruta.**	**Depende de custo cadastrado na base**
PBI-09	**Visão dos supervisores**	**Como supervisor, quero comparar meta vs. realizado.**	**Depende de metas disponíveis**
PBI-13	**Entrega**	**Como usuário, quero treinamento para usar o painel.**	**Sessão realizada e guia entregue**
PBI-14	**Análises avançadas**	**Como diretor, quero curva ABC de clientes e produtos.**	**Classificação A/B/C com filtro**

O Product Backlog é um artefato vivo: a ordem acima é inicial e será ajustada pelo Product Owner nas sessões de Refinement. PBI-07 e PBI-09 têm dependências externas (existência de custo e metas) e ficam mais abaixo até serem destravados.

4. Sprints e Sprint Goals

Sugestão: Sprints de 2 semanas (a confirmar, dependendo da disponibilidade do PO).

Sprint	Sprint Goal	PBIs no Sprint Backlog	Incremento esperado
Sprint 0	Alinhar entendimento e viabilizar o desenvolvimento	Levantamento de KPIs, definições de negócio, wireframes, acesso à base	Product Backlog refinado e acesso liberado
Sprint 1	Ter dados de vendas confiáveis no modelo	PBI-01, 02, 03	Modelo de dados validado
Sprint 2	Disponibilizar a visão executiva	PBI-04, 05, 06	Primeiro dashboard utilizável pela diretoria
Sprint 3	Habilitar o acompanhamento da equipe de vendas	PBI-08, 12	Dashboard de supervisores publicado
Sprint 4	Garantir segurança e adoção	PBI-11, 10, 13	Painel seguro e usuários treinados

Os demais PBIs (07, 09, 14) entram conforme as dependências forem resolvidas. As estimativas em story points serão feitas no Sprint Planning, com base em tamanho relativo.

5. Eventos do Scrum

Sprint Planning

Define o Sprint Goal e seleciona os PBIs do Sprint Backlog.

Daily Scrum

15 minutos para alinhar progresso e impedimentos. Em formato solo, pode ser um registro escrito diário.

Sprint Review

Demonstração do Incremento ao Product Owner e stakeholders, coletando feedback para adaptar o Product Backlog.

Sprint Retrospective

Inspeção do processo e definição de melhorias para a próxima Sprint.

Backlog Refinement

Detalhamento e reordenação contínua dos PBIs.

6. Definition of Ready (DoR) e Definition of Done (DoD)

DoR — Um PBI entra no Sprint quando:

- Tem critérios de aceite claros
- As dependências de dados estão resolvidas
- Foi estimado
- O PO está disponível para dúvidas

DoD — Um Incremento está pronto quando:

- Os números foram conferidos com um relatório de referência da empresa
- Filtros e segmentações foram testados
- O desempenho está aceitável
- O Product Owner aceitou na Sprint Review

7. Riscos e Mitigações

Item	Tipo	Mitigação
Acesso à base não liberado	Impedimento / dependência externa	Sprint 0 só encerra com acesso confirmado
Qualidade dos dados	Risco técnico	Levantar inconsistências na Sprint 1
Ausência de custo e metas na base	Dependência	Planilhas complementares fornecidas pelo cliente
Definição ambígua de "venda"	Risco de requisito	Acordar no Sprint 0 e registrar no DoD
Disponibilidade do PO	Risco de processo	Combinar agenda fixa de Reviews



8. Compromissos dos Artefatos

Cada artefato tem um compromisso associado: Product Goal para o Product Backlog, Sprint Goal para o Sprint Backlog e Definition of Done para o Incremento.

Conclusão: Resumo e Próximos Passos



Product Goal

Visão clara e unificada do que queremos alcançar com o produto.



Product Backlog

Lista priorizada de todos os trabalhos necessários, viva e em constante refinamento.



Sprints & Goals

Ciclos de tempo fixo focados em entregar incrementos valiosos e utilizáveis.



Eventos Scrum

Estrutura para inspeção e adaptação, garantindo transparência e melhoria contínua.



DoR & DoD

Definições de Pronto e Feito para assegurar a qualidade e o alinhamento das entregas.



Riscos e Mitigações

Abordagem para identificar e gerenciar desafios ao longo do desenvolvimento.



Compromissos

Cada artefato do Scrum possui um compromisso, reforçando foco e responsabilidade.

A implementação dessas práticas Scrum visa maximizar a entrega de valor e a adaptação às mudanças, resultando em um produto de alta qualidade que atende às necessidades do negócio.
